


## 平成 28 年 11 月 1 日現在 建設状況について

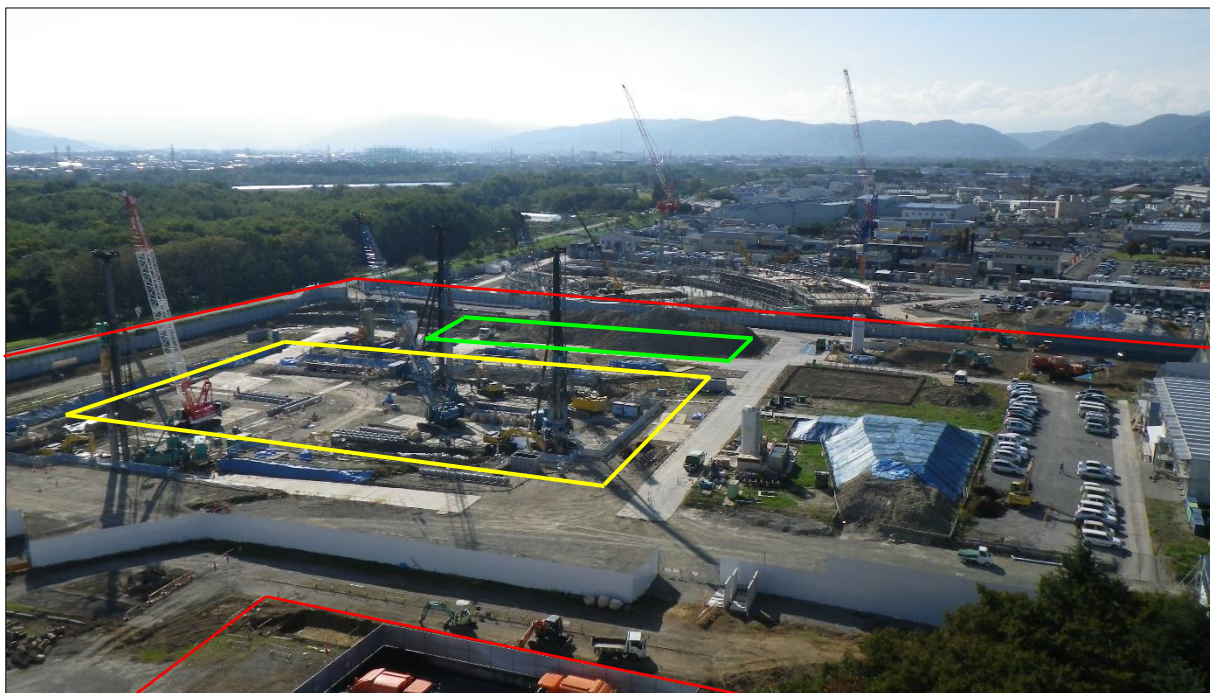

全景 赤枠：工事範囲  
緑枠：管理棟建設範囲  
黄枠：工場棟建設範囲

### ・ 工事進捗

9月に着手した工場棟杭工事を継続しています。

工事エリア拡大のため、敷地東側（写真の下側）の外構工事に着手しました。

### ・ 工場棟東側外構工事

進捗に伴う工事エリア拡大のため、敷地東側の樹木伐採、プレキャストL型擁壁設置および仮囲い盛替を行います。基礎砕石、基礎コンクリート打設後、L型擁壁を設置していきます。



写真左：基礎コンクリート打設後



写真右：L型擁壁設置中
