

平成 29 年 2 月 1 日現在 建設状況について



全景 赤枠：工事範囲
 緑枠：管理棟建設範囲
 黄枠：工場棟建設範囲

・ 工事進捗

9月に着手した工場棟地下部分の杭工事が終了しました。
 12月に着手したアースアンカー工事及び地下躯体エリアの掘削工事を継続しています。
 煙突、アプローチデッキの杭工事を開始しました。


・ ごみピット、地下躯体エリアの掘削工事の状況掲載

右図は工場棟基礎関係平面図に、各階エリアを示したものです。現在はその中の水色で示した範囲まで掘削が完了しています。約3万m³を掘削し、敷地内の盛土等に利用する計画です。

9月号で紹介しました止水工事により、掘削範囲の地下水位は低く保たれているため、掘削作業は順調に進んでいます。

凡例

- 青線：工場棟地上1階
- 緑線：工場棟地下1階
- 赤線：工場棟地下2階
- 水色：掘削完了範囲
- 三角：次ページへ掲載している写真の撮影方向

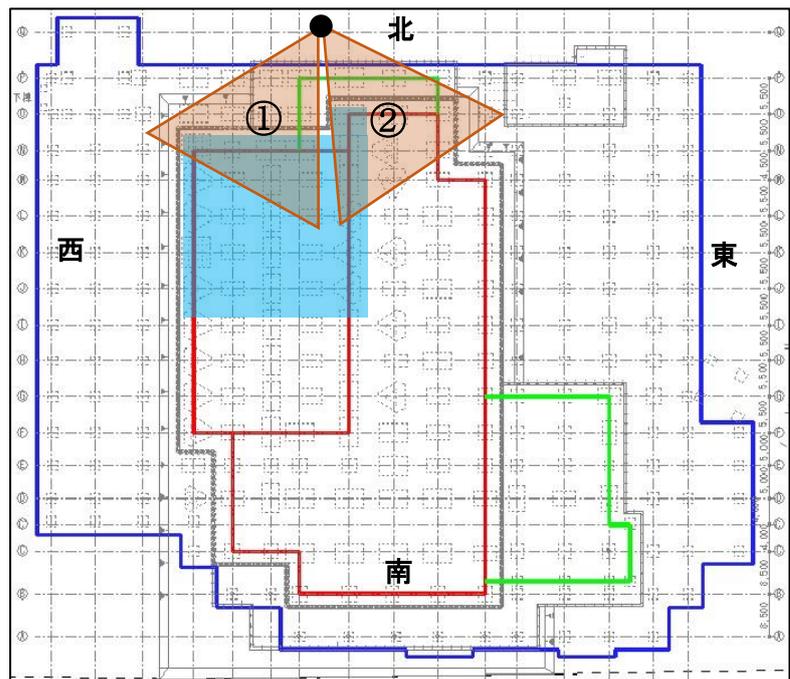



①
前ページ平面図、掘削範囲北側から南西方向を撮影。
杭頭が確認できます。奥ではバックホウにて掘削・搬出作業を行っています。



②
前ページ平面図、掘削範囲北側から南東方向を撮影。
2段目アンカー打設後、残りの掘削を行います。
