


平成 29 年 3 月 1 日現在 建設状況について

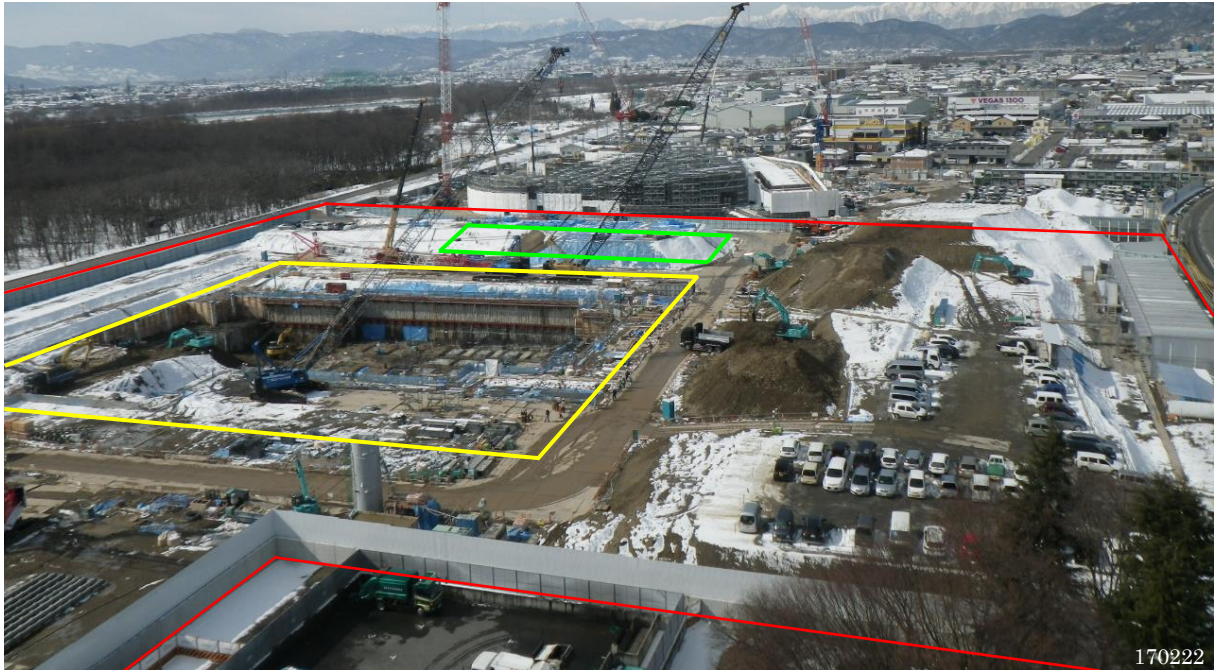


全景 赤枠：工事範囲
 緑枠：管理棟建設範囲
 黄枠：工場棟建設範囲

・ 工事進捗

12月に着手した工場棟地下2階躯体エリアの掘削工事が完了しました。
 地下躯体を形成するため、型枠・鉄筋コンクリート工事を開始しました。
 煙突部分の土砂掘削工事が完了し、基礎工事に着手しました。

・ ごみピット、地下躯体エリア掘削工事の状況

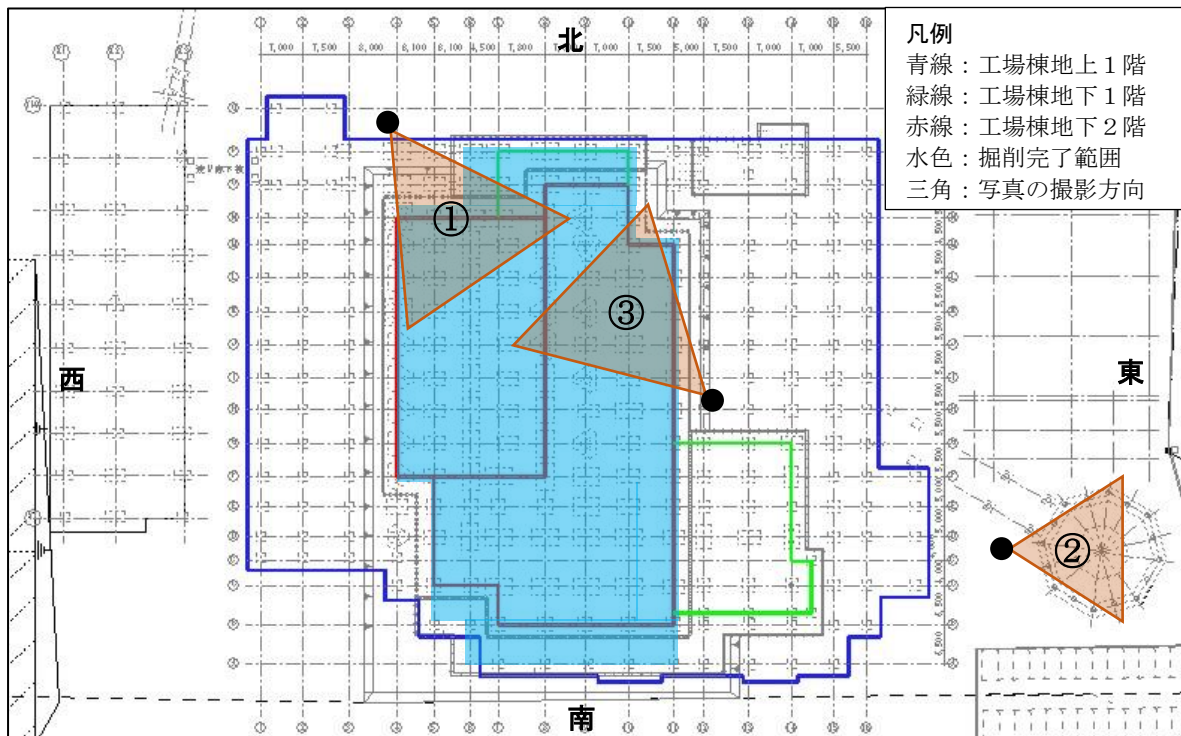

ごみピット・地下躯体エリアの掘削はほぼ完了し、写真①のとおり、コンクリート打設のため、型枠・鉄筋工事の準備が進められています。

写真左側建屋部分は、梁が細かく配置されており、安全に施工ができるよう、足場が組まれ、型枠が施工されていきます。写真右側ごみピット部分は、すでに一部基礎コンクリートが打設されており、この上部には耐圧盤(1.6m厚コンクリート)を打設します。



写真②は煙突部分の掘削が完了し、基礎砕石を敷いている状況です。高さ80mの煙突を支える16本の杭頭が確認できます。引き続き鉄筋工事にも着手していきます。

写真③は工場棟東側から北西を撮影しています。奥に積み上がった掘削土があります。安定勾配を確保し、積み上げが完了した部分には養生を行います。常に安全管理に努めてまいります。

