

平成 29 年 5 月 1 日現在 建設状況について




赤枠：工事範囲 黄枠：建物範囲（右から管理棟、工場棟、スラグストックヤード棟、煙突）
長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

工場棟 地下2階の鉄筋、型枠、支保工、コンクリート工事を行っています。

煙 突 外筒工事を行っています。

・平面図

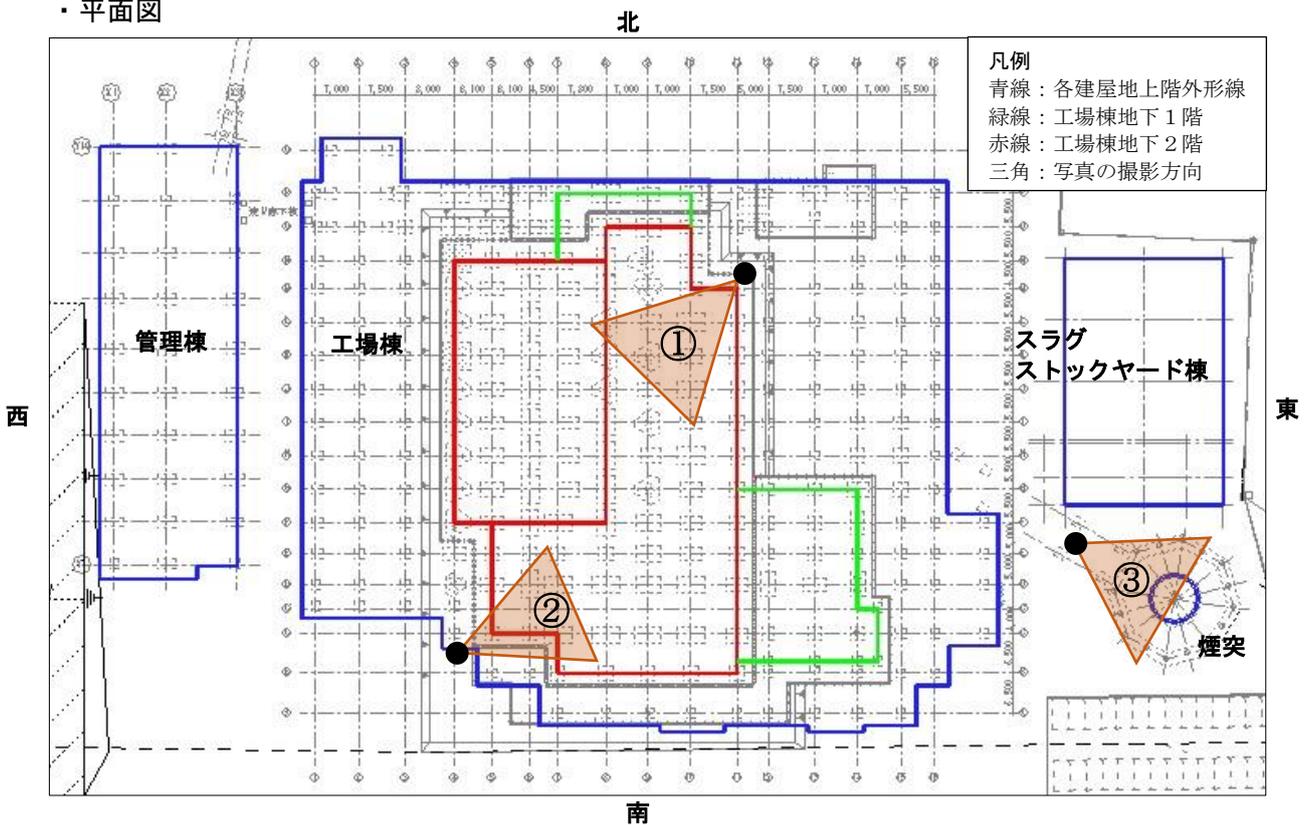

写真① 工場棟

工場棟地下躯体部の状況です。作業用の足場が設置され、鉄筋、型枠工事等を行います。クレーンを使用し、資材運搬を行います。



写真② 工場棟

写真①と比較すると、こちらはまだ柱の鉄筋が立ち上がっているのみです。壁、梁、地下1階の床を施工していくと写真①のような状況になります。

写真②の床面に黄色の型枠で組まれた四角い箱は、機器を設置する基礎を施工しているところです。



写真③ 煙突

直径 20m、深さ 4.5mの基礎部分のコンクリート打設が完了しました。

これからタワークレーンを設置し、外筒工事（煙突の外側部分の工事）に入っていきます。

