

平成 29 年 7 月 1 日現在 建設状況について





長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

- 建築工事 工場棟地下1階躯体工事を行っています。
- プラント工事 支保工の解体が済んだ地下2階から機器搬入を開始しました。
- 煙突工事 外筒工事を継続しています。

・平面図

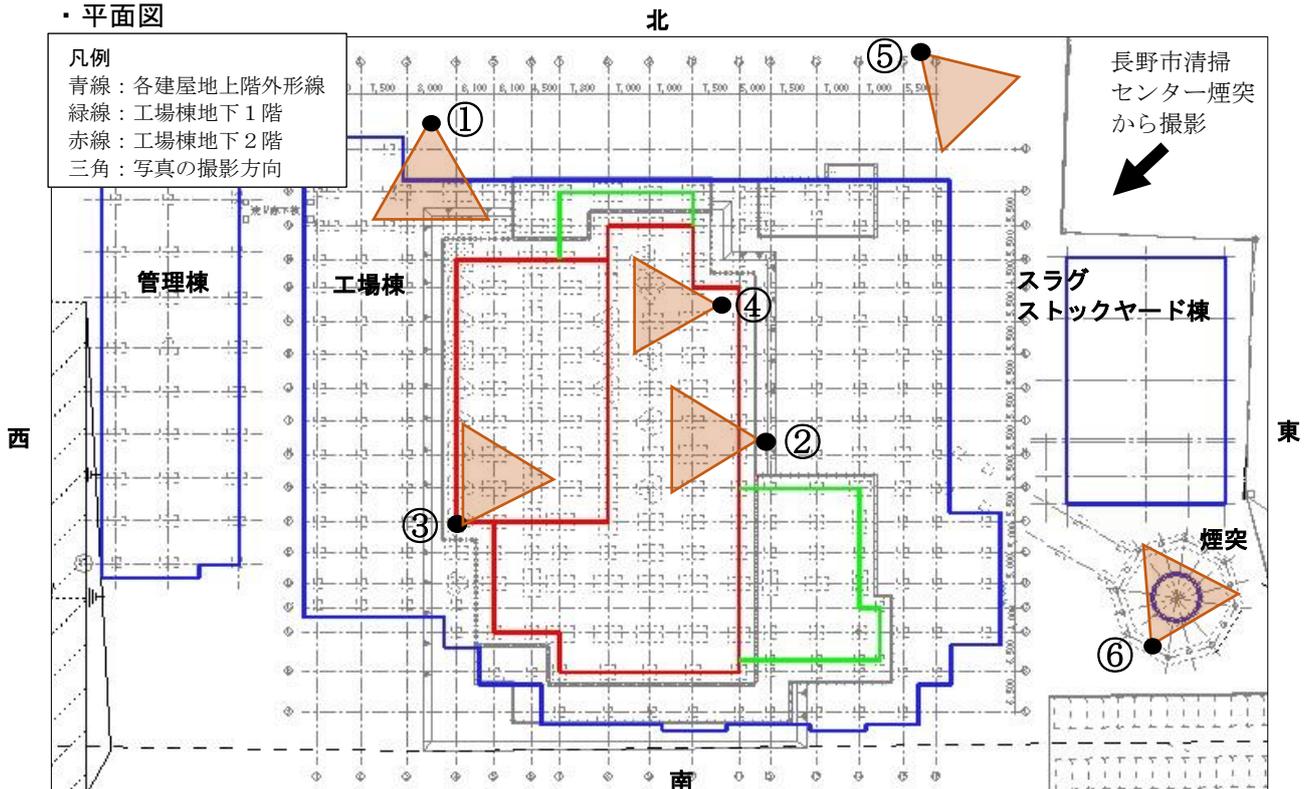

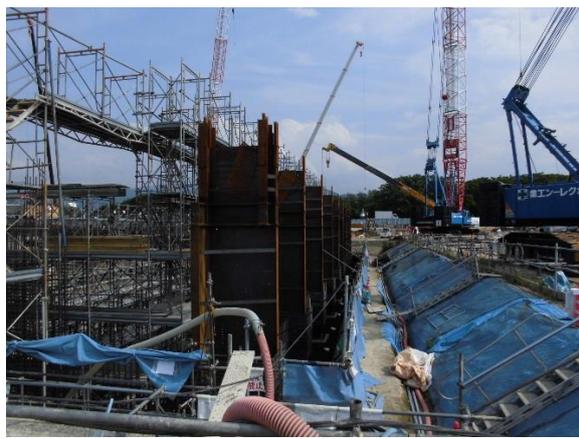

撮影①  
地下ピット西側の鉄骨。躯体地下部分は SRC 造です。



撮影②  
コンクリート打設前の梁配筋状況です。必要箇所にはスリーブ等がコンクリート打設前に施工されます。



撮影③  
ピット内状況です。作業に必要な足場が組みまれています。



撮影④  
プラント機器搬入のための開口です。地下1階部分にはまだ支保工が施工されています。



撮影⑤  
プラント設備：建屋内で灰を搬送するコンベヤです。この仮置き場から 350 t クローラークレーンで吊り上げ、搬入します。



撮影⑥  
煙突施工状況です。現状地盤から 11m の高さです。
