

平成 30 年 5 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- | | | |
|------|---------|--------------------------|
| 建築工事 | (工場棟) | 各工区、屋根スラブ、外装工事、電気・機械設備工事 |
| | (管理棟) | 屋根、内装・外装工事、電気・機械設備工事 |
| | (SSY棟他) | 屋根、外装工事 |
| | (煙突) | 外装、電気設備工事 |

プラント工事 1階～5階機器取り込み・設置、プラント配管、電気・機械設備工事

・ 平面図

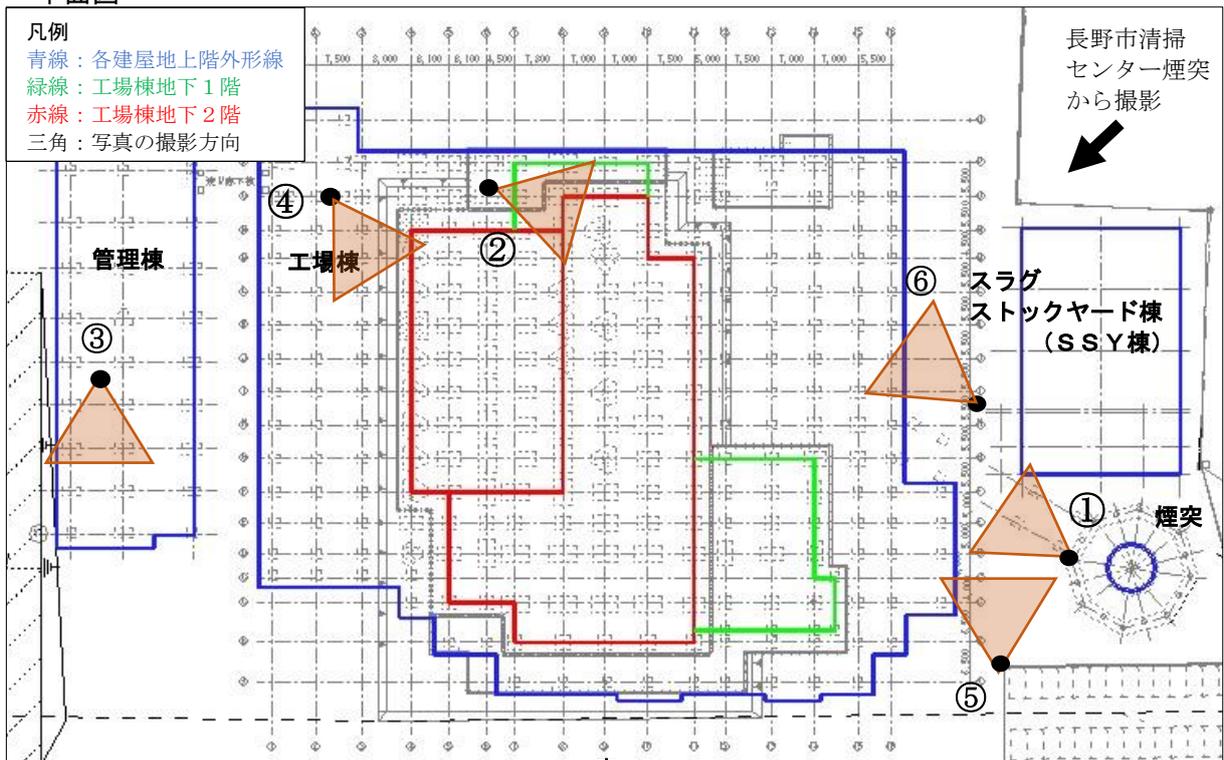



撮影① 工場棟全体

工場棟の屋根部分を煙突から見た施工状況です。屋根部分にデッキが設置されました。



撮影④ ごみ投入ホップ

ごみ投入ホップの設置状況です。ホップ最大開口は約6m、炉内幅は約3mあります。




撮影② 工場棟屋根部分

工場棟の屋根から見た施工状況です。デッキ上へ鉄筋配筋を行いました。この後にコンクリートを打設します。



撮影⑤ 煙道・内筒

煙突へ接続する煙道・内筒の設置状況です。3炉分の内筒が設置されました。

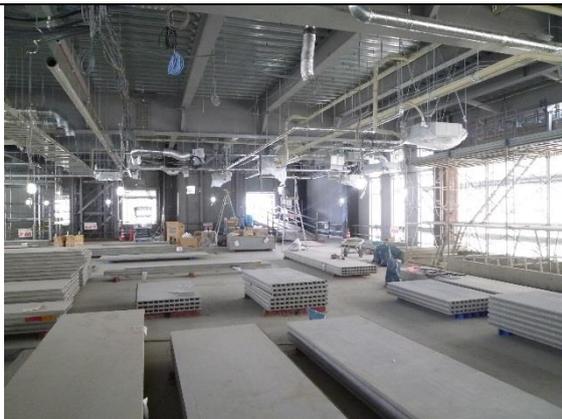

撮影③ 管理棟3階

管理棟3階の内部施工状況です。建築工事では壁材料の設置、電気・機械設備工事では天井の配線・配管工事を行っています。



撮影⑥ 吸気サイレンサー

吸気サイレンサーの設置状況です。低圧蒸気復水器の騒音を抑制します。サイレンサー1本の高さは約4mで、奥行は約3mあります。
