





































長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績


凡例  計画  実績

項目	平成30年 (2018年)												平成31年 (2019年)												平成32年 (2020年)								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
準備工・片付け工																																	
貯留構造物工事																																	
遮水設備工事																																	
地下水集排水施設工事																																	
浸出水集排水・ガス抜施設工事																																	
雨水集排水施設																																	
管理道路工事																																	
モニタリング施設工事																																	
防災調整池工事																																	
付帯設備工事																																	
東側法面对策工事																																	
撤去工事・植栽工																																	

平成32年9月30日
完成予定

進捗状況

■積雪がある場合は、除雪等を行いながら切土・盛土作業を実施しています。

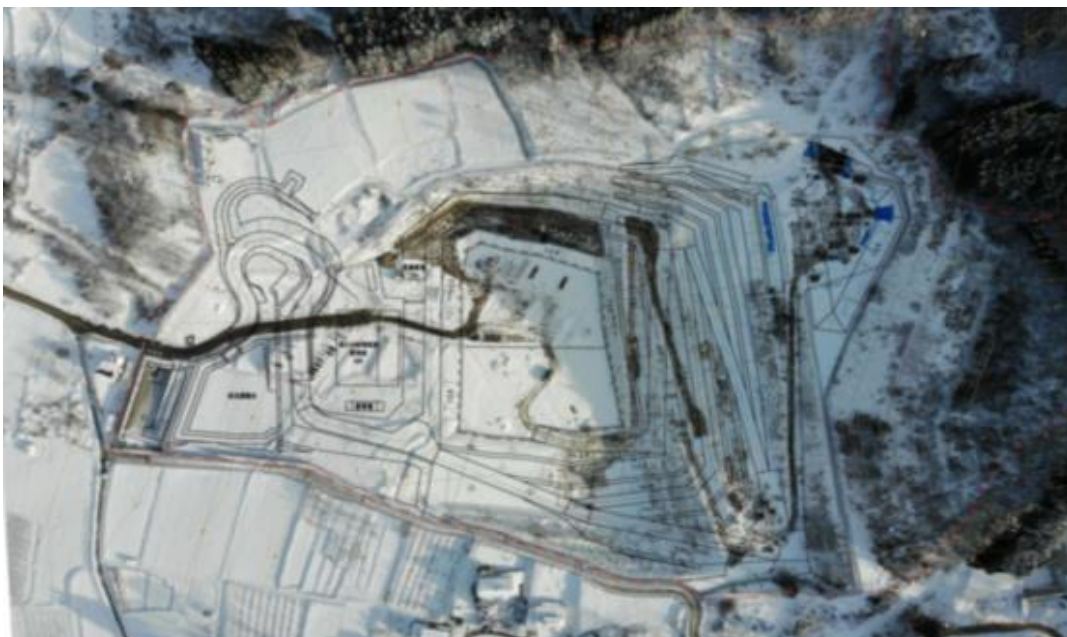

最終処分場全景写真
