

平成 30 年 9 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- | | | |
|--------|--------|---------------------------|
| 建築工事 | (工場棟) | 内装・外装・外構工事、電気・機械設備工事 |
| | (管理棟) | 内装・外装工事、電気・機械設備工事 |
| | (SSY棟) | 屋根、外装工事、電気・機械設備工事 |
| | (計量棟他) | 建屋工事、ピット・機器据付工事、電気・機械設備工事 |
| プラント工事 | | 各階機器据付、プラント配管、電気・機械設備工事 |

・ 平面図

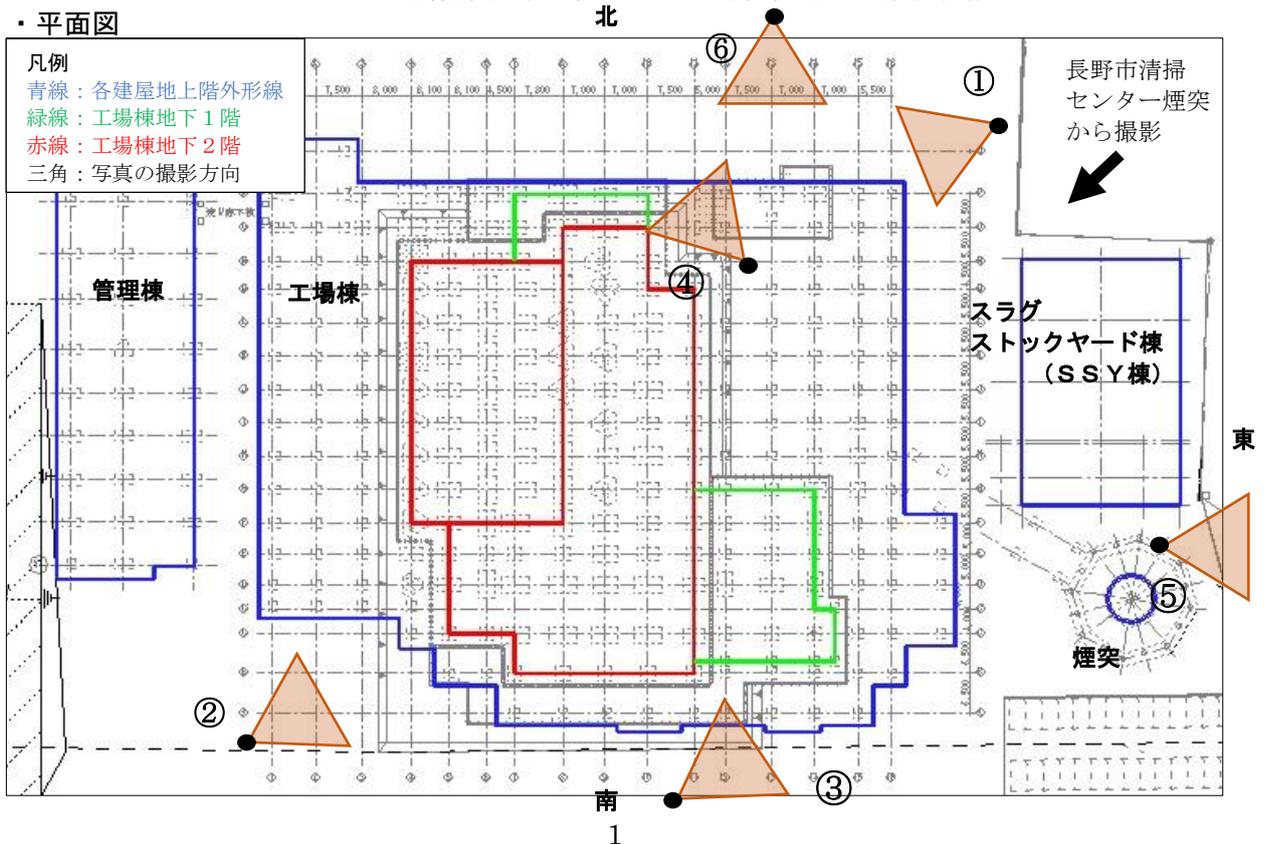



撮影① 外構（北側）

外構工事の状況です。各計量棟の建設が進み、アプローチデッキも北側緩衝緑地までつながりました。



撮影④ 温水熱交換機

蒸気の熱エネルギーを水に伝え温水にするための設備です。



撮影② 外構（南側）

外構工事の状況です。10月のごみ搬入に向けて構内道路の施工が始まりました。



撮影⑤ 灯油貯留槽

灯油貯留槽の消防検査状況です。工場棟用では、50 m³の灯油を貯留することができます。



撮影③ 外構（煙突側）

煙突の塗装状況です。ゴンドラを煙突に設置し、仕上げ塗装を行いました。



撮影⑥ カードリーダー

入口計量棟のカードリーダー設置状況です。ごみを搬入する際に、カードをかざし、計量を行います。
