

(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事




現場ブログ



皆様こんにちは。まだまだ暑い日が続いていますが、朝晩はだいぶ涼しくなり、秋の近づきを感じる今日この頃です。さて、季節が秋へと進んでいく中、B焼却施設建設工事も着々と進んでいますので、8月の進捗状況を皆様にお知らせします。

◆現場の写真をチェック！

(令和元年8月31日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲)

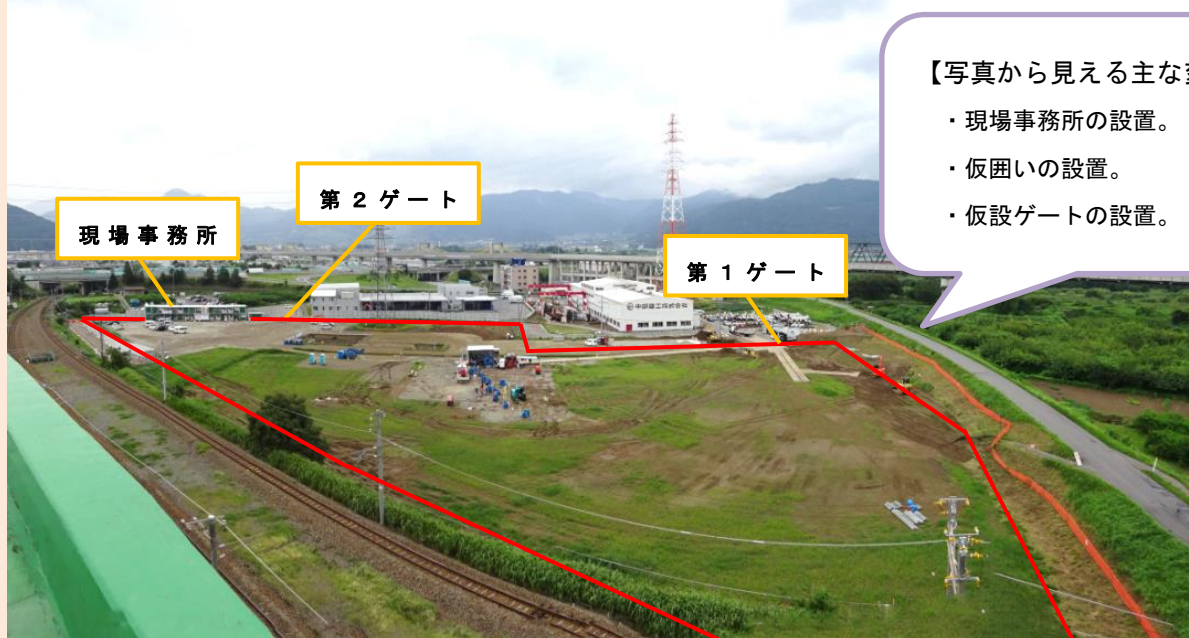

【写真から見える主な変化】

- ・現場事務所の設置。
- ・仮囲いの設置。
- ・仮設ゲートの設置。


◆こんな作業を行いました！

8月は工場棟のごみピットをつくるための準備工事として、地下部分に止水工事を行いました。ごみピットとは集めたごみを一時的に溜めておく設備であり、地下から地上にまで及ぶ大きな「箱」のようなものです。これをつくるためには地下掘削が必要ですが、そのまま掘削すると地下水が浸み出し、工事の支障となります。そこで掘削前に止水層を作り、底からの地下水の侵入を防ぎます。

作業の様子↓



イメージ図☞

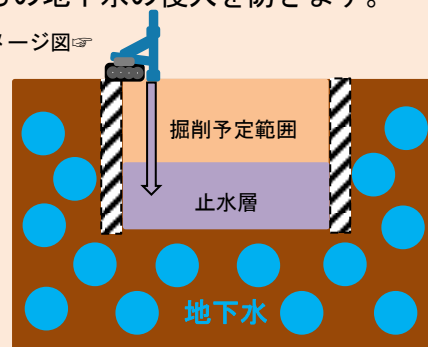

9月も引続き、準備工事として、山留工事を行う計画です。(上記イメージ図の斜線部分が工事予定箇所です。)皆様には御迷惑をお掛けいたしますが、引続き安全に、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、御理解、御協力いただきますようお願いいたします。
