

平成 29 年 6 月 1 日現在 建設状況について




赤枠：工事範囲 黄枠：建物範囲（右から管理棟、工場棟、スラグストックヤード棟、煙突）
長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

工場棟 地下1階の鉄筋、型枠、支保工、コンクリート工事を行っています。
煙 突 外筒工事を行っています。

・ 平面図

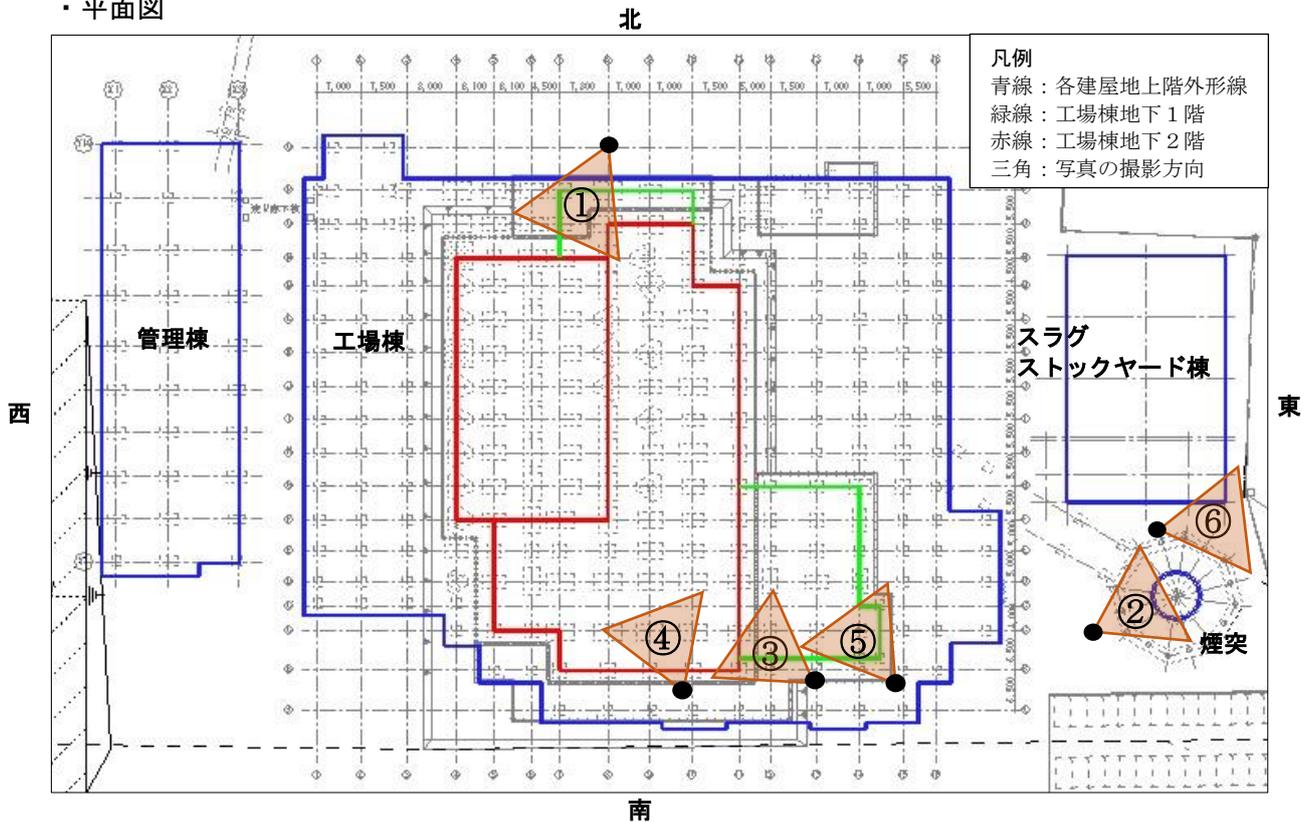



①工場棟北側より撮影
ごみピット躯体壁面部を施工しています。壁面部に沿って作業足場が組まれています。



②煙突西側より撮影
煙突（外筒）の建設作業を行っています。金属製の型枠を使用し、コンクリート打設を行います。



③工場棟南東より撮影
黄色線より手前側は地下1階まで、奥側は地下2階まで施工しています。



④工場棟南東より撮影
多くの作業員の方々が現場内で作業を進めています。落下防止対策のため安全帯の装備は必須です。



⑤工場棟南東より撮影
地下1階部分の地中梁を施工しています。



⑥敷地境界東側を撮影
現長野市清掃センターとの敷地境界部にはL型擁壁を施工しています。
