

平成 30 年 11 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

建築工事	(工場棟)	外構工事、電気・機械設備工事 (運転調整)
	(管理棟)	情報発信設備工事、電気・機械設備工事 (運転調整)
	(SSY棟)	電気・機械設備工事 (運転調整)
	(計量棟他)	電気・機械設備工事 (運転調整)
プラント工事		電気・機械設備工事 (運転調整)


・平面図

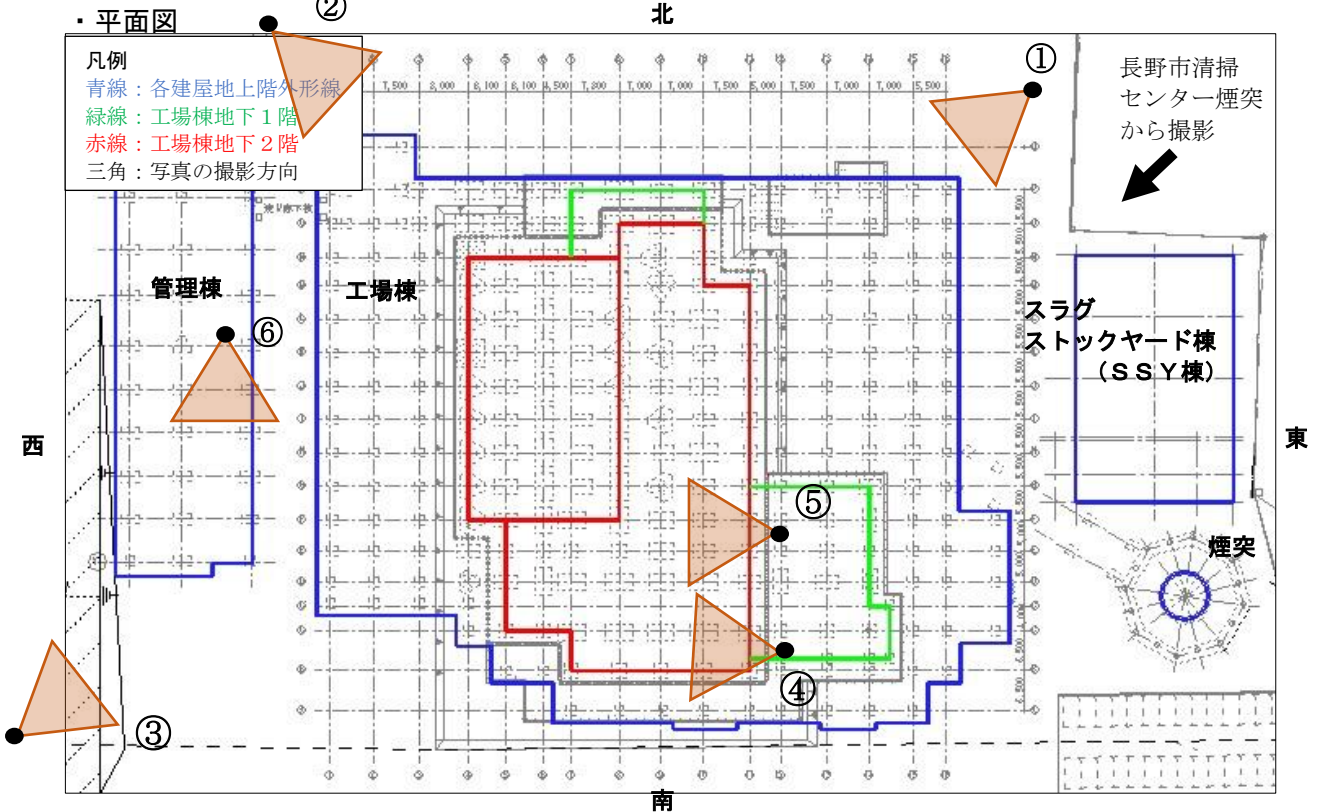



**撮影① 外構（北側1）**

北側緩衝緑地など外構工事が進められています。仮設外構サインや仮設路面表示を設置して場内の案内を行っています。

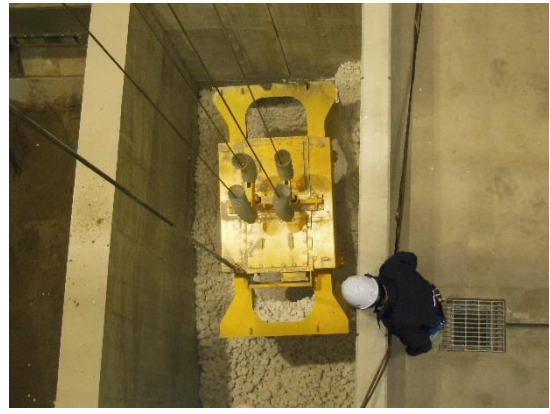


**撮影④ 灰クレーン・灰ピット**

灰の積出し場です。今月より灰の搬出が始まりました。DXN(粉塵)の管理区域として立入が制限されています。



**撮影② 外構（北側2）**

構内動線は、一般車両が通るレーンとパッカ一車が通るレーンを分けて整備しています。

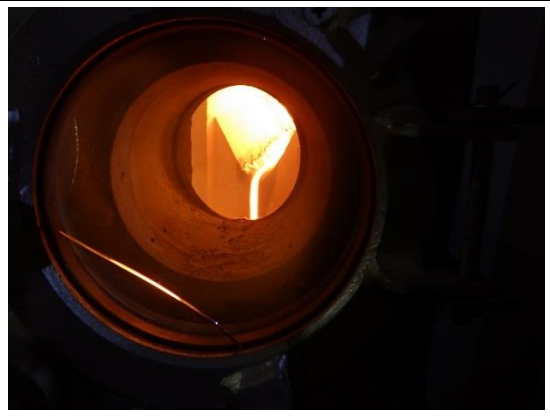

**撮影⑤ 灰溶融炉**

灰溶融炉の試運転状況です。赤く光っている液体は、灰を溶かしたもので、水で冷やすとスラグになります。



**撮影③ 外構（南側）**

通用口に門扉の袖壁が設置されました。なお、工場煙突より出ている白い物体は、水蒸気です。



**撮影⑥ 情報発信設備（ポリバケツシアター）**

ポリバケツシアターの施工状況です。中では施設紹介映像を見ることができます。
