


一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事



工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。

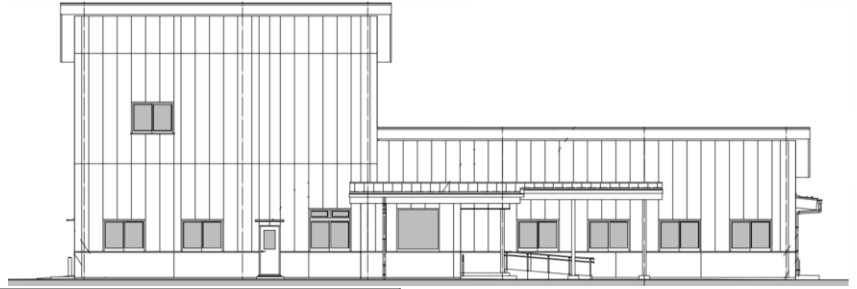


工事概要

工事名称	長野広域連合一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設建設工事	建物名	浸出水処理施設
工事場所	須坂市大字亀倉字栗毛・左方外	建築面積	604.77m ²
発注者	長野広域連合	階高	地上2階,地下1階
施工者	共和化工・須坂土建・村山建設 特定建設工事共同企業体	構造	地上S造,地下RC造
工事期間	2018年5月31日～2021年1月29日		
工事内容	浸出水処理施設建設工事 (建築工事・プラント工事他)		

工事現場位置図

-  工事車両運行路
-  写真撮影位置

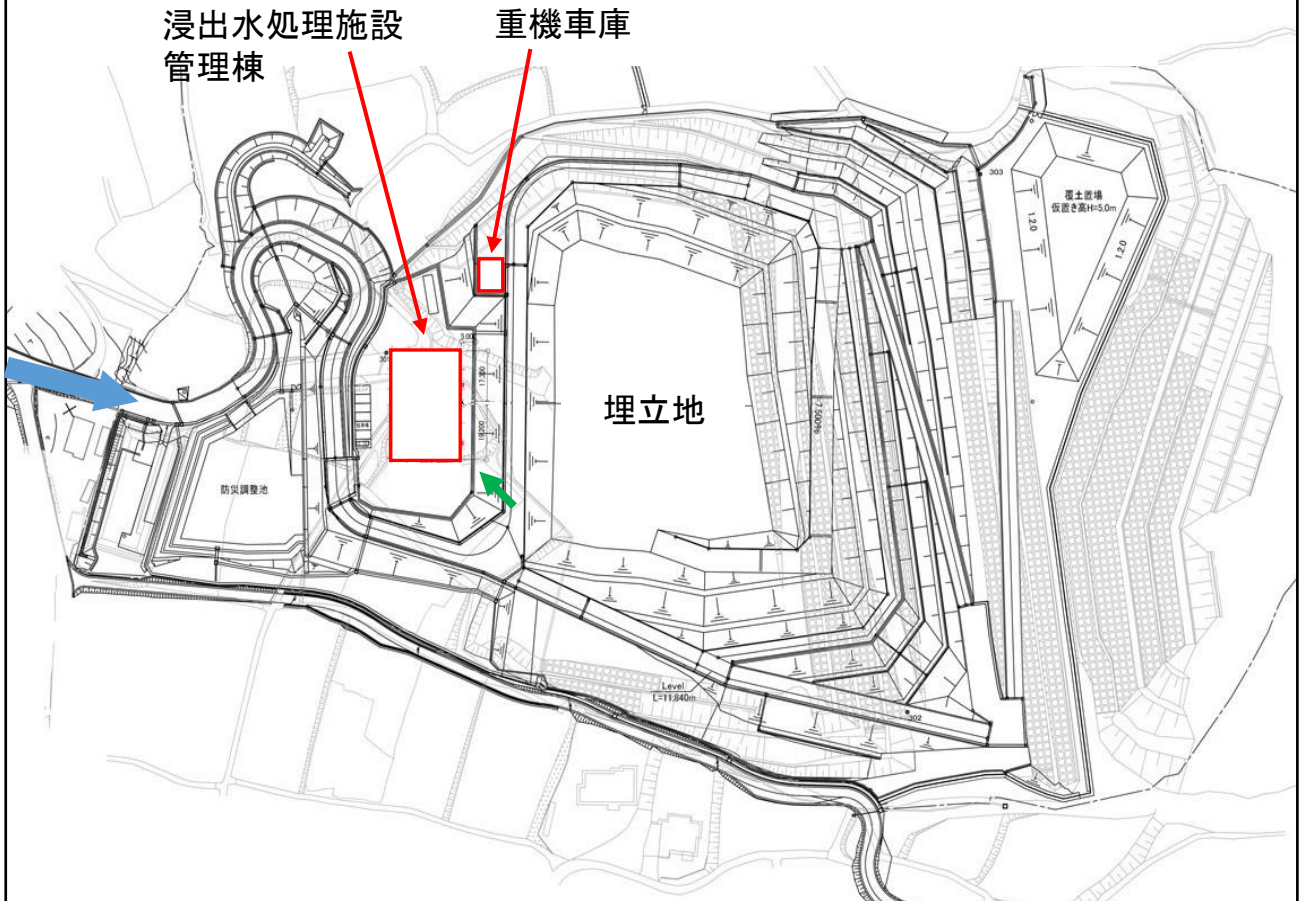

赤色の部分が施工範囲です。

工程計画

凡例

■ 計画
■ 実績

■ 工事のスケジュールです。

区分	工種	平成30年(2018年)												平成31年				令和元年(2019年)												令和2年(2020年)												令和3年
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1									
設計	建築・プラント設計	■																																								
仮設	準備工	■																																								
	地業工事	■																																								
浸出水処理施設	土工事	■																																								
	水槽工事	■																																								
外構	建屋工事	■																																								
	プラント電気設備	■																																								
他	プラント機械・配管設備	■																																								
	試運転	■																																								
外構	重機車庫棟	■																																								
	給排水配管	■																																								
他	電気	■																																								

工事進捗状況



コンクリート打設状況

【水槽工事】

3,000㎡の容量を備えた浸出水調整槽(水槽)の工事が終盤を迎えています。写真は、水槽上部の開口部分をコンクリートで打設している状況です。

11月上旬からは、建屋工事が本格的に始まります。

